Agregative
SYSTEMS

PROJET ATLAS

Présentation au client

Suivi des commandes de l'atelier, Menuiserie Roux

Comité de pilotage du 27 octobre 2026

Présentation d'exemple, données fictives

Ce document, ainsi que l'ensemble de ses contenus, éléments graphiques, méthodologiques et rédactionnels, est la propriété exclusive de Agregative Systems. Il ne peut être utilisé, transmis, copié, reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit de Agregative Systems.

1. Rappel de votre besoin *(cahier des charges, v3)*

> **« Aujourd'hui, je donne les délais aux clients de mémoire. Je voudrais que l'atelier voie ses commandes sur une tablette. »**
>
> Mme Roux, gérante, réunion du 12 octobre

Atelier de 24 personnes, 6 à 10 commandes en cours en même temps

Saisies en double entre l'atelier, la comptabilité et l'accueil

Suivi sur papier et tableur, sans vue d'ensemble

Ce que vous attendez de l'outil

1 seul outil

de suivi, partagé entre l'atelier et le bureau

Délais fiables

calculés et envoyés automatiquement au client

0 saisie en double

entre les trois services concernés

Ce document, ainsi que l'ensemble de ses contenus, éléments graphiques, méthodologiques et rédactionnels, est la propriété exclusive de Agregative Systems. Il ne peut être utilisé, transmis, copié, reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit de Agregative Systems.

2. Ce qui est livré à ce jour *(Planning.docx)*

LIVRABLE	CONTENU	DATE	STATUT
Cadrage	Cahier des charges, version 3 validée	Septembre	TERMINÉ
Maquettes	Écran atelier (tablette) et écran bureau	Octobre	VALIDÉ
Base des commandes	Fiches commande, états, délais calculés	Octobre	TERMINÉ
Écran atelier	Suivi des commandes sur tablette	Novembre	EN COURS
Reprise des commandes	Import du tableur actuel	Novembre	EN COURS
Formation	Deux sessions, atelier puis bureau	Décembre	À VENIR


3 sur 6
livrables terminés

2
en cours de réalisation

Janvier
mise en service prévue

Ce document, ainsi que l'ensemble de ses contenus, éléments graphiques, méthodologiques et rédactionnels, est la propriété exclusive de Agregative Systems. Il ne peut être utilisé, transmis, copié, reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit de Agregative Systems.


3. Planning *(Planning.docx)*

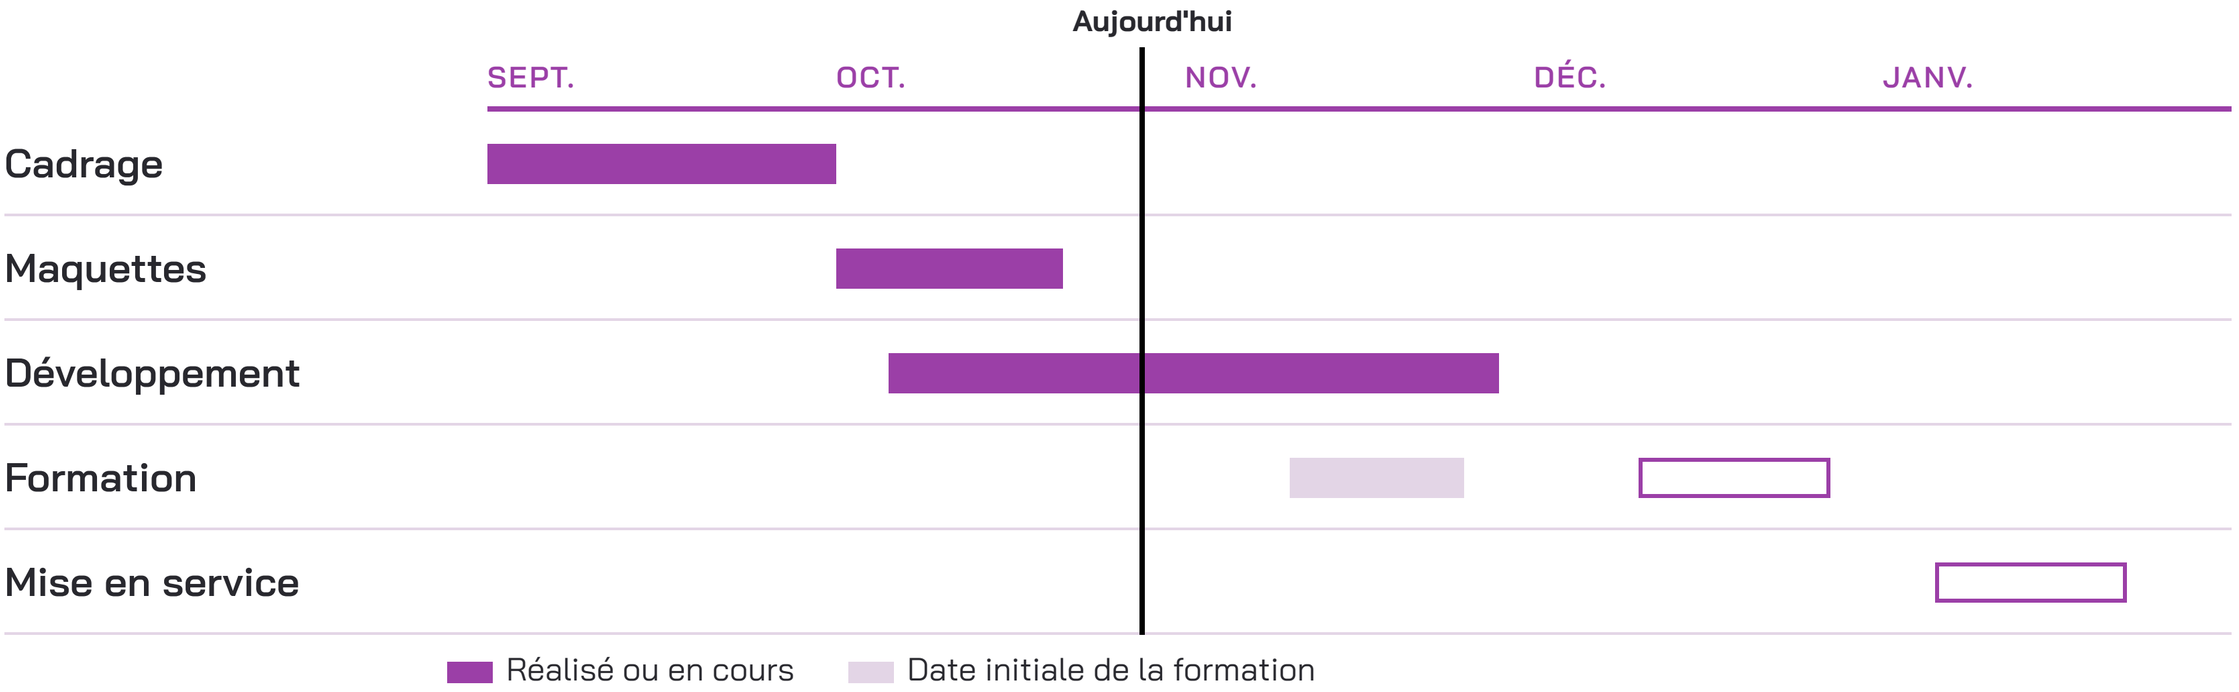

La formation passe de novembre à la mi-décembre, à votre demande (réunion du 21 octobre). La mise en service reste en janvier.

Ce document, ainsi que l'ensemble de ses contenus, éléments graphiques, méthodologiques et rédactionnels, est la propriété exclusive de Agregative Systems. Il ne peut être utilisé, transmis, copié, reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit de Agregative Systems.

4. Budget *(Budget.xlsx, onglet Suivi, montants hors taxes)*

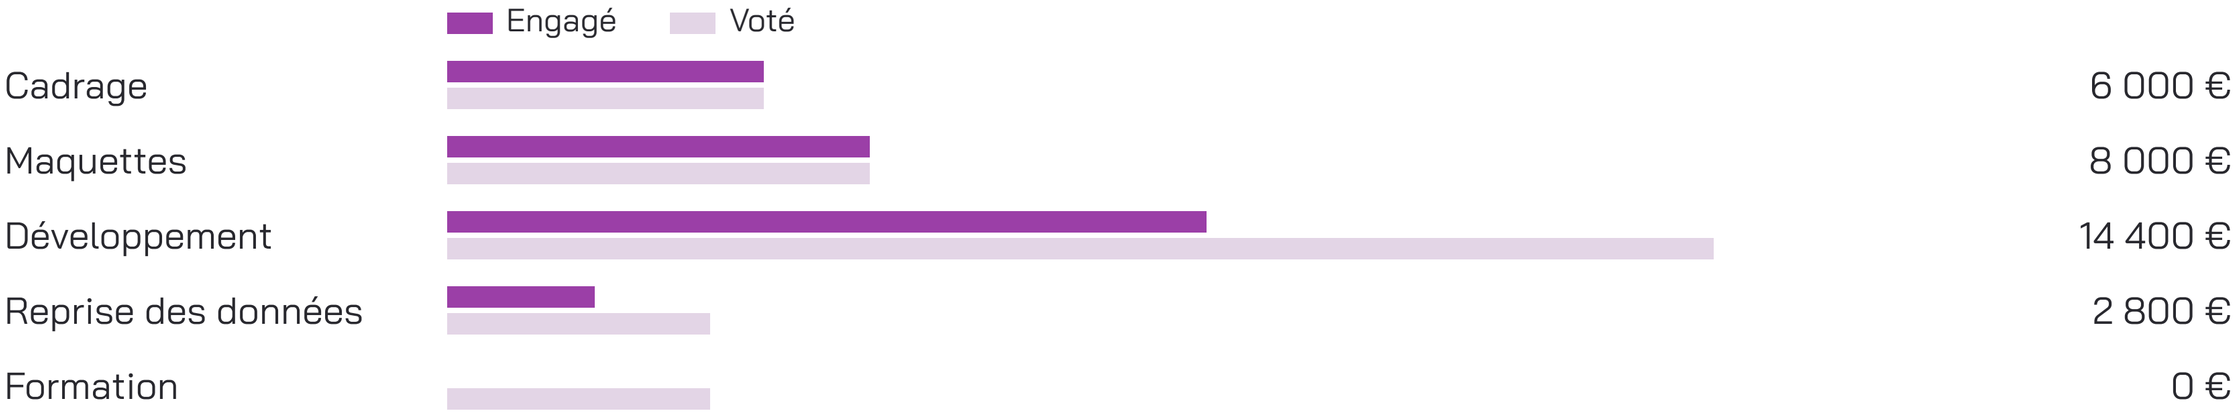

48 000 €
Budget voté

31 200 €
Engagé, soit 65 %

16 800 €
Reste à engager

Aucun dépassement : les montants engagés suivent le budget voté poste par poste.

Ce document, ainsi que l'ensemble de ses contenus, éléments graphiques, méthodologiques et rédactionnels, est la propriété exclusive de Agregative Systems. Il ne peut être utilisé, transmis, copié, reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit de Agregative Systems.

5. Vos retours et nos décisions *(réunions et appels client)*

DATE	CE QUE VOUS NOUS AVEZ DIT	CE QUE NOUS AVONS DÉCIDÉ
12 OCT	« Les couleurs de l'écran atelier sont trop claires pour la tablette. »	Couleurs retouchées, maquette validée le jour même
19 OCT	« La comptabilité peut attendre, le suivi atelier passe avant. »	Export comptable en phase 2, pour tenir janvier
21 OCT	« Novembre est notre mois chargé, formez-nous en décembre. »	Formation fixée à la mi-décembre, deux sessions

3
échanges avec vous depuis le dernier comité

3
décisions prises, toutes tracées

0
point en désaccord

Ce document, ainsi que l'ensemble de ses contenus, éléments graphiques, méthodologiques et rédactionnels, est la propriété exclusive de Agregative Systems. Il ne peut être utilisé, transmis, copié, reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit de Agregative Systems.

6. Risques et points à valider de votre côté

Risques suivis

RISQUE	NIVEAU	PARADE
Disponibilité des équipes en décembre	MOYEN	Deux créneaux au choix
Format des anciennes commandes	MOYEN	Export du tableur actuel
Retard sur le développement	FAIBLE	Point à chaque comité

Ce que nous attendons de vous

Vendredi : l'export du tableur des commandes en cours

Cette semaine : un référent atelier pour les tests

Avant le 15 nov. : le choix des deux créneaux de formation

Aucun de ces points ne remet en cause la mise en service de janvier.

Ce document, ainsi que l'ensemble de ses contenus, éléments graphiques, méthodologiques et rédactionnels, est la propriété exclusive de Agregative Systems. Il ne peut être utilisé, transmis, copié, reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit de Agregative Systems.

7. Prochaines étapes *(Planning.docx et réunions client)*



Nous : livrer la version de test à l'atelier mi-novembre

Vous : désigner le référent et transmettre l'export du tableur

Décision demandée aujourd'hui : valider la date de formation de la mi-décembre.

Ce document, ainsi que l'ensemble de ses contenus, éléments graphiques, méthodologiques et rédactionnels, est la propriété exclusive de Agregative Systems. Il ne peut être utilisé, transmis, copié, reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou partie, sans l'accord préalable et écrit de Agregative Systems.
